
		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		**Implantation du chantier**	**5 jours**	**15/12/2025 08:00**	**19/12/2025 17:00**		
2		Implantation, nivaux	1 jour	15/12/2025 08:00	15/12/2025 17:00		Chef de chantier;Ouvrier A;Theodolite;To...
3		Piquetage fondations	1 jour	16/12/2025 08:00	16/12/2025 17:00	2	Chef de chantier;Topographe;Ouvrier A;T...
4		Baraque chantier	1 jour	17/12/2025 08:00	17/12/2025 17:00	3	Baraque;Chef de chantier;Clotures;Ouvrier...
5		Stockage matériaux	1 jour	18/12/2025 08:00	18/12/2025 17:00	4	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B
6		Signalisation et sécurité	1 jour	19/12/2025 08:00	19/12/2025 17:00	5	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B
8		**TERRASSEMENT**	**6 jours**	**22/12/2025 08:00**	**29/12/2025 17:00**	**1**	
9		Décapage terrain	2 jours	22/12/2025 08:00	23/12/2025 17:00		Brouette;Camion;Conducteur A;Conducte...
10		Fouilles pour semelle isolees	3 jours	24/12/2025 08:00	26/12/2025 17:00	9	Brouette;Camion;Conducteur A;Conducte...
11		Evacuations des debris	1 jour	29/12/2025 08:00	29/12/2025 17:00	10	Ouvrier A;Ouvrier B;Conducteur A;Cond...
13		**Fondation en BA**	**18 jours**	**30/12/2025 08:00**	**22/01/2026 17:00**	**8**	
14		Béton de propreté	2 jours	30/12/2025 08:00	31/12/2025 17:00		Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;Macon B;Ai...
15		Coffrage semelles	4 jours	01/01/2026 08:00	06/01/2026 17:00	14	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;Macon B;Pa...
16		Ferraillagesemelles	4 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00		Aciers;Ouvrier C;Ouvrier D;Macon C;Mac...
17		Pose des tiges d'ancrage	2 jours	07/01/2026 08:00	08/01/2026 17:00	15;16	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B;Mac...
18		Bétonnagesemelles	2 jours	09/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00	17	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;Macon B;Ai...
19		Cure et decoffrage	8 jours	13/01/2026 08:00	22/01/2026 17:00	18	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;Macon B
21		**Fabrication des Profilees**	**17 jours**	**30/12/2025 08:00**	**21/01/2026 17:00**	**8**	
22		Coupe profilés	4 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00		Metallier A;Mettalier B;Profiles IPE,HEA
23		Soudure éléments	6 jours	05/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00	22	Soudeur A;Soudeur B
24		Percage pour boulonnage	3 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026 17:00	23	Metallier A;Mettalier B
25		Protection anticorrosion	4 jours	16/01/2026 08:00	21/01/2026 17:00	24	Metallier A;Mettalier B
27		**TRANSPORT & STOCKAGE**	**2 jours**	**22/01/2026 08:00**	**23/01/2026 17:00**	**21**	
28		Transport éléments charpente	2 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00	25	Chef de chantier;Ouvrier C;Conducteur A;...
30		**MONTAGE CHARPENTE**	**20 jours**	**26/01/2026 08:00**	**20/02/2026 17:00**	**13;27**	
31		Pose poteaux	5 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00		Chef de chantier;Grutier;Monteur A;Monte...
32		Pose poutres	5 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00	31	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B;Mon...
33		Pose pannes et contreventements	6 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00	32	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B;Mon...
34		Soudure de réglage et reparation	2 jours	17/02/2026 08:00	18/02/2026 17:00	33	Soudeur A;Ouvrier A;Chef de chantier
35		Serrage final et contrôle	2 jours	19/02/2026 08:00	20/02/2026 17:00	34	Monteur A;Ouvrier A;Chef de chantier
37		**CLOISONS EXTÉRIEURES et isolati...**	**11 jours**	**23/02/2026 08:00**	**09/03/2026 17:00**	**30**	
38		Pose ossature secondaire	3 jours	23/02/2026 08:00	25/02/2026 17:00		Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C
39		Pose panneaux sandwich	5 jours	26/02/2026 08:00	04/03/2026 17:00	38	Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C;Pannaux s...
40		Étanchéité et joints	3 jours	05/03/2026 08:00	09/03/2026 17:00	39	Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C
42		**CONTRÔLE FINAL et reception**	**4 jours**	**10/03/2026 08:00**	**13/03/2026 17:00**	**37**	
43		Vérification boulonnage	2 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00		Chef de chantier;Ouvrier A;Monteur A
44		Vérification alignement	2 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00		Ingenieur;Topographe;Ouvrier B
45		Nettoyage chantier	2 jours	12/03/2026 08:00	13/03/2026 17:00	44;43	Chef de chantier;Ouvrier A

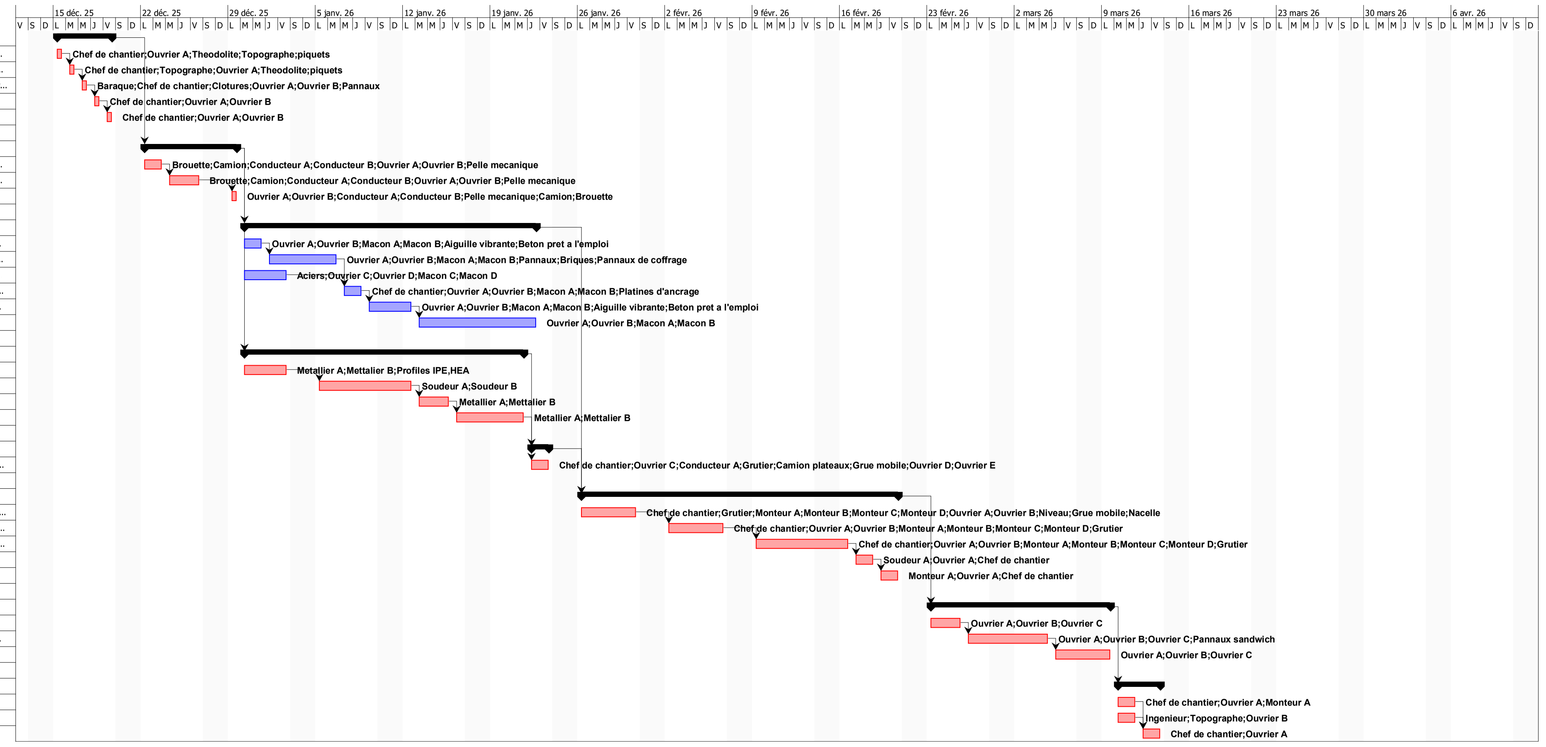

Hangar industriel de stockage
