Who Does What

ID ressource	Ressource
2	**Chef de chantier**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	ref
2	Installation de chantier	24 heures	100 %	0
3	Clôture + signalisation	16 heures	100 %	0
4	Implantation topographique	16 heures	100 %	0
7	Décapage	8 heures	100 %	0
8	Fouilles	24 heures	100 %	0
9	Nivellement + compactage	16 heures	100 %	0
14	Bétonnage fondations	8 heures	100 %	0
20	Dallage RDC	32 heures	100 %	0
27	Bétonnage	8 heures	100 %	0
33	Bétonnage	16 heures	100 %	0
41	Bétonnage	8 heures	100 %	0
47	Bétonnage	16 heures	100 %	0
56	Bétonnage	8 heures	100 %	0
62	Bétonnage	16 heures	100 %	0
68	Murs RDC	40 heures	100 %	0
75	Retrait installations	8 heures	100 %	0
		264 heures		

ID ressource	Ressource
3	**Maçons**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	ref
14	Bétonnage fondations	12,8 heures	400 %	0
20	Dallage RDC	64 heures	200 %	0
27	Bétonnage	25,6 heures	600 %	0
33	Bétonnage	96 heures	600 %	0
41	Bétonnage	48 heures	600 %	0
47	Bétonnage	96 heures	600 %	0

ID ressource	Ressource			
56	Bétonnage	48 heures	600 %	0
62	Bétonnage	96 heures	600 %	0
68	Murs RDC	80 heures	200 %	0
69	Murs étage 1	80 heures	200 %	0
70	Murs étage 2	80 heures	200 %	0
		726,4 heures		

4 **Coffreurs**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
12	Coffrage fondations	64 heures	400 %	0
15	Cure béton	320 heures	400 %	0
20	Dallage RDC	128 heures	400 %	0
25	Coffrage	96 heures	400 %	0
31	Coffrage	160 heures	400 %	0
39	Coffrage	96 heures	400 %	0
45	Coffrage	160 heures	400 %	0
54	Coffrage	96 heures	400 %	0
60	Coffrage	160 heures	400 %	0
21	Cure	320 heures	400 %	0
28	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
34	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
42	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
48	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
57	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
63	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
35	Escalier	320 heures	400 %	0
49	Escalier	320 heures	400 %	0
64	Escalier	320 heures	400 %	0
		4 480 heures		

ID ressource	Ressource
5	**Ferrailleurs**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
13	Ferraillage fondations	64 heures	400 %	0
20	Dallage RDC	128 heures	400 %	0
26	Ferraillage	64 heures	400 %	0
32	Ferraillage	96 heures	400 %	0
40	Ferraillage	64 heures	400 %	0
46	Ferraillage	96 heures	400 %	0
55	Ferraillage	64 heures	400 %	0
61	Ferraillage	96 heures	400 %	0
35	Escalier	320 heures	400 %	0
49	Escalier	320 heures	400 %	0
64	Escalier	320 heures	400 %	0
		1 632 heures		

ID ressource	Ressource
6	**Manœuvres**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
2	Installation de chantier	72 heures	300 %	0
3	Clôture + signalisation	48 heures	300 %	0
4	Implantation topographique	16 heures	100 %	0
7	Décapage	16 heures	200 %	0
8	Fouilles	48 heures	200 %	0
9	Nivellement + compactage	32 heures	200 %	0
12	Coffrage fondations	42,667 heures	400 %	0
13	Ferraillage fondations	32 heures	200 %	0
14	Bétonnage fondations	40 heures	500 %	0
15	Cure béton	320 heures	400 %	0
20	Dallage RDC	3,332 heures	600 %	0
25	Coffrage	96 heures	400 %	0
31	Coffrage	160 heures	400 %	0
39	Coffrage	96 heures	400 %	0

ID ressource	Ressource			
45	Coffrage	160 heures	400 %	0
54	Coffrage	96 heures	400 %	0
60	Coffrage	160 heures	400 %	0
26	Ferraillage	32 heures	200 %	0
32	Ferraillage	48 heures	200 %	0
40	Ferraillage	32 heures	200 %	0
46	Ferraillage	48 heures	200 %	0
55	Ferraillage	32 heures	200 %	0
61	Ferraillage	48 heures	200 %	0
27	Bétonnage	32 heures	600 %	0
33	Bétonnage	96 heures	600 %	0
41	Bétonnage	48 heures	600 %	0
47	Bétonnage	96 heures	600 %	0
56	Bétonnage	48 heures	600 %	0
62	Bétonnage	96 heures	600 %	0
21	Cure	320 heures	400 %	0
28	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
34	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
42	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
48	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
57	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
63	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
35	Escalier	480 heures	600 %	0
49	Escalier	480 heures	600 %	0
64	Escalier	480 heures	600 %	0
68	Murs RDC	80 heures	200 %	0
69	Murs étage 1	80 heures	200 %	0
70	Murs étage 2	80 heures	200 %	0
74	Nettoyage chantier	96 heures	600 %	0
75	Retrait installations	32 heures	400 %	0
		6 141,998		

ID ressource	Ressource
7	Conducteur

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
7	Décapage	8 heures	100 %	0
8	Fouilles	48 heures	200 %	0
		56 heures		

ID ressource	Ressource
9	Topographe

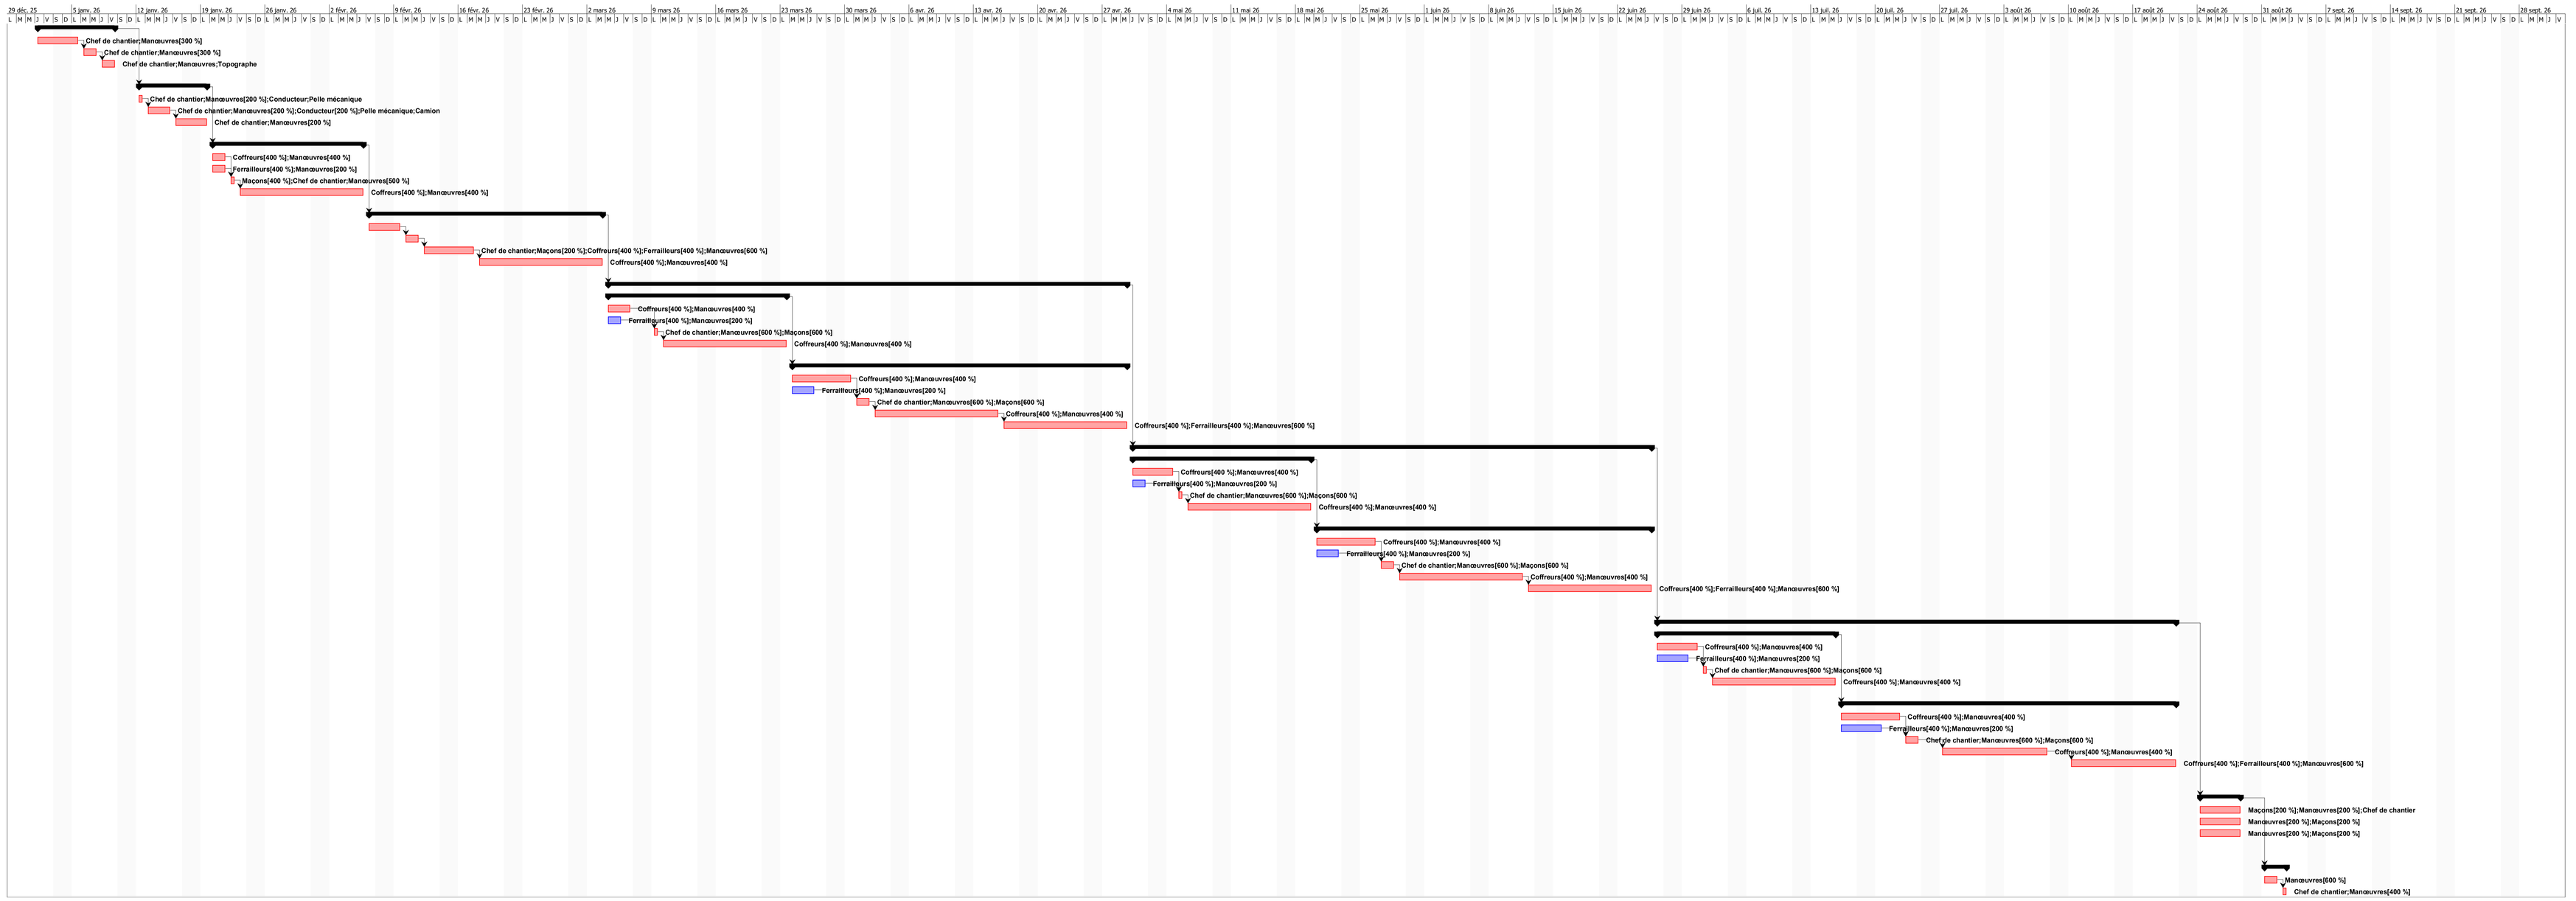
ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
4	Implantation topographique	16 heures	100 %	0
		16 heures		

ID ressource	Ressource
13	Pelle mécanique

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
7	Décapage	1	100 %	0
8	Fouilles	1	100 %	0
		0 heures		

ID ressource	Ressource
16	Camion

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
8	Fouilles	1	100 %	0
		0 heures		


29 déc. 25
5 janv. 26
12 janv. 26
19 janv. 26
26 janv. 26
2 févr. 26
9 févr. 26
16 févr. 26
23 févr. 26
2 mars 26
9 mars 26
16 mars 26
23 mars 26
30 mars 26
6 avr. 26
13 avr. 26
20 avr. 26
27 avr. 26
4 mai 26
11 mai 26
18 mai 26
25 mai 26
1 juin 26
8 juin 26
15 juin 26
22 juin 26
29 juin 26
6 juil. 26
13 juil. 26
20 juil. 26
27 juil. 26
3 août 26
10 août 26
17 août 26
24 août 26
31 août 26
7 sept. 26
14 sept. 26
21 sept. 26
28 sept. 26
Chef de chantier;Manœuvres[300 %]
Chef de chantier;Manœuvres[300 %]
Chef de chantier;Manœuvres;Topographe
Chef de chantier;Manœuvres[200 %];Conducteur;Pelle mécanique
Chef de chantier;Manœuvres[200 %];Conducteur[200 %];Pelle mécanique;Camion
Chef de chantier;Manœuvres[200 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[200 %]
Maçons[400 %];Chef de chantier;Manœuvres[500 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Chef de chantier;Maçons[200 %];Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[200 %]
Chef de chantier;Manœuvres[600 %];Maçons[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[200 %]
Chef de chantier;Manœuvres[600 %];Maçons[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[200 %]
Chef de chantier;Manœuvres[600 %];Maçons[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[200 %]
Chef de chantier;Manœuvres[600 %];Maçons[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[200 %]
Chef de chantier;Manœuvres[600 %];Maçons[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[200 %]
Chef de chantier;Manœuvres[600 %];Maçons[600 %]
Coffreurs[400 %];Manœuvres[400 %]
Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[400 %];Manœuvres[600 %]
Maçons[200 %];Manœuvres[200 %];Chef de chantier
Manœuvres[200 %];Maçons[200 %]
Manœuvres[200 %];Maçons[200 %]
Manœuvres[600 %]
Chef de chantier;Manœuvres[400 %]

Projet batiment R+2

Dates			
Start	01/01/2026 08:00	Finish	02/09/2026 17:00
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	175 jours	Remaining	175 jours
Baseline	0 jours	Actual	0 jours
		Percent Complete	0 %

Work			
Scheduled	13 348,398 heures	Remaining	13 348,398 heures
Baseline	0 heures	Actual	0 heures

Costs			
Scheduled	3407543,67 €	Remaining	3407543,67 €
Baseline	0,00 €	Actual	0,00 €
		Variance	0,00 €

Notes

		Nom	RBS	Catégorie	A...	Ét...	Initiales	Groupe	Unités max.
1		**Employes**		**Travail**			**E**		**100 %**
2		Chef de chantier	chef	Travail			CC	1	100 %
3		Maçons	travail	Travail			M	2	600 %
4		Coffreurs	travail	Travail			C	3	400 %
5		Ferrailleurs	travail	Travail			F	4	400 %
6		Manœuvres	travail	Travail			MO	5	600 %
7		Conducteur	travail	Travail			P	6	200 %
8		Grutier	travail	Travail			G	7	100 %
9		Topographe	travail	Travail			T	8	100 %
10		**Materiels**		**Matériel**			**M**		
11		Pelle mécanique	materiel	Matériel			Pelle	9	
12		Grue	materiel	Matériel			Grue	10	
13		Rouleau compresseur	materiel	Matériel			Copacteur	11	
14		Camion	materiel	Matériel			C		

Tarif standard	Taux des heures supplémentaires	Coût par utilisation	Courir au	Calendrier de base
0,00 €/heure	0,00 €/heure	**0,00 €**	**Prorata**	**Standard**
375,00 €/heure	0,00 €/heure	0,00 €	Prorata	Standard
310,00 €/heure	0,00 €/heure	0,00 €	Prorata	Standard
300,00 €/heure	0,00 €/heure	0,00 €	Prorata	Standard
300,00 €/heure	0,00 €/heure	0,00 €	Prorata	Standard
200,00 €/heure	0,00 €/heure	0,00 €	Prorata	Standard
310,00 €/heure	0,00 €/heure	0,00 €	Prorata	Standard
320,00 €/heure	0,00 €/heure	0,00 €	Prorata	Standard
250,00 €/heure	0,00 €/heure	0,00 €	Prorata	Standard
0,00 €		**0,00 €**	**Prorata**	
0,00 €		0,00 €	Prorata	
0,00 €		0,00 €	Prorata	
0,00 €		0,00 €	Prorata	
0,00 €		0,00 €	Prorata	

		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécess...	Noms des ressources
1		**Préparation du chantier**	**7 jours**	**01/01/2026 08:00**	**09/01/2026 17:00**		
2		Installation de chantier	3 jours	01/01/202608:00	05/01/202617:00		Chef de chantier;Manœuvres[...
3		Clôture + signalisation	2 jours	06/01/202608:00	07/01/202617:00	2	Chef de chantier;Manœuvres[...
4		Implantation topographique	2 jours	08/01/202608:00	09/01/202617:00	3	Chef de chantier;Manœuvres;...
6		**Terrassement**	**6 jours**	**12/01/2026 08:00**	**19/01/2026 17:00**	**1**	
7		Décapage	1 jour	12/01/202608:00	12/01/202617:00		Chef de chantier;Manœuvres[...
8		Fouilles	3 jours	13/01/202608:00	15/01/202617:00	7	Chef de chantier;Manœuvres[...
9		Nivellement + compactage	2 jours	16/01/202608:00	19/01/202617:00	8	Chef de chantier;Manœuvres[...
11		**Fondation**	**13 jours**	**20/01/2026 08:00**	**05/02/2026 17:00**	**6**	
12		Coffrage fondations	2 jours	20/01/202608:00	21/01/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
13		Ferraillage fondations	2 jours	20/01/202608:00	21/01/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
14		Bétonnage fondations	1 jour	22/01/202608:00	22/01/202617:00	13;12	Maçons[400 %];Chef de chanti...
15		Cure béton	10 jours	23/01/202608:00	05/02/202617:00	14	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
17		**Soubassement**	**18 jours**	**06/02/2026 08:00**	**03/03/2026 17:00**	**11**	
18		Élévation murs de soubass...	2 jours	06/02/202608:00	09/02/202617:00		
19		Remblaiement périphérique	2 jours	10/02/202608:00	11/02/202617:00	18	
20		Dallage RDC	4 jours	12/02/202608:00	17/02/202617:00	19	Chef de chantier;Maçons[200 ...
21		Cure	10 jours	18/02/202608:00	03/03/202617:00	20	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
23		**Structure du RDC**	**41 jours**	**04/03/2026 08:00**	**29/04/2026 17:00**	**17**	
24		**Poteaux**	**14 jours**	**04/03/2026 08:00**	**23/03/2026 17:00**		
25		Coffrage	3 jours	04/03/202608:00	06/03/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
26		Ferraillage	2 jours	04/03/202608:00	05/03/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
27		Bétonnage	1 jour	09/03/202608:00	09/03/202617:00	25;26	Chef de chantier;Manœuvres[...
28		Décoffrage+cure	10 jours	10/03/202608:00	23/03/202617:00	27	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
30		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**24/03/2026 08:00**	**29/04/2026 17:00**	**24**	
31		Coffrage	5 jours	24/03/202608:00	30/03/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
32		Ferraillage	3 jours	24/03/202608:00	26/03/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
33		Bétonnage	2 jours	31/03/202608:00	01/04/202617:00	31;32	Chef de chantier;Manœuvres[...
34		Décoffrage+cure	10 jours	02/04/202608:00	15/04/202617:00	33	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
35		Escalier	10 jours	16/04/202608:00	29/04/202617:00	34	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
37		**Structure du 1ere etage**	**41 jours**	**30/04/2026 08:00**	**25/06/2026 17:00**	**23**	
38		**Poteaux**	**14 jours**	**30/04/2026 08:00**	**19/05/2026 17:00**		
39		Coffrage	3 jours	30/04/202608:00	04/05/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
40		Ferraillage	2 jours	30/04/202608:00	01/05/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
41		Bétonnage	1 jour	05/05/202608:00	05/05/202617:00	39;40	Chef de chantier;Manœuvres[...
42		Décoffrage+cure	10 jours	06/05/202608:00	19/05/202617:00	41	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
44		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**20/05/2026 08:00**	**25/06/2026 17:00**	**38**	
45		Coffrage	5 jours	20/05/202608:00	26/05/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
46		Ferraillage	3 jours	20/05/202608:00	22/05/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
47		Bétonnage	2 jours	27/05/202608:00	28/05/202617:00	45;46	Chef de chantier;Manœuvres[...
48		Décoffrage+cure	10 jours	29/05/202608:00	11/06/202617:00	47	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
49		Escalier	10 jours	12/06/202608:00	25/06/202617:00	48	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
52		**Structure du 2eme etage**	**41 jours**	**26/06/2026 08:00**	**21/08/2026 17:00**	**37**	
53		**Poteaux**	**14 jours**	**26/06/2026 08:00**	**15/07/2026 17:00**		
54		Coffrage	3 jours	26/06/202608:00	30/06/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
55		Ferraillage	2 jours	26/06/202608:00	29/06/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
56		Bétonnage	1 jour	01/07/202608:00	01/07/202617:00	55;54	Chef de chantier;Manœuvres[...
57		Décoffrage+cure	10 jours	02/07/202608:00	15/07/202617:00	56	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
59		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**16/07/2026 08:00**	**21/08/2026 17:00**	**53**	
60		Coffrage	5 jours	16/07/202608:00	22/07/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
61		Ferraillage	3 jours	16/07/202608:00	20/07/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
62		Bétonnage	2 jours	23/07/202608:00	24/07/202617:00	60;61	Chef de chantier;Manœuvres[...
63		Décoffrage+cure	10 jours	27/07/202608:00	07/08/202617:00	62	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
64		Escalier	10 jours	10/08/202608:00	21/08/202617:00	63	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
67		**Murs**	**5 jours**	**24/08/2026 08:00**	**28/08/2026 17:00**	**52**	
68		Murs RDC	5 jours	24/08/202608:00	28/08/202617:00		Maçons[200 %];Manœuvres[2...
69		Murs étage 1	5 jours	24/08/202608:00	28/08/202617:00		Manœuvres[200 %];Maçons[2...
70		Murs étage 2	5 jours	24/08/202608:00	28/08/202617:00		Manœuvres[200 %];Maçons[2...
73		**Fin de chantier**	**3 jours**	**31/08/2026 08:00**	**02/09/2026 17:00**	**67**	
74		Nettoyage chantier	2 jours	31/08/202608:00	01/09/202617:00		Manœuvres[600 %]
75		Retraitinstallations	1 jour	02/09/202608:00	02/09/202617:00	74	Chef de chantier;Manœuvres[...

Task Information

ID	Nom	Durée	Début	
1	Préparation du chantier	7 jours	01/01/2026 08:00	09/01/2026
2	Installation de chantier	3 jours	01/01/2026 08:00	05/01/2026
3	Clôture + signalisation	2 jours	06/01/2026 08:00	07/01/2026
4	Implantation topographique	2 jours	08/01/2026 08:00	09/01/2026
6	Terrassement	6 jours	12/01/2026 08:00	19/01/2026
7	Décapage	1 jour	12/01/2026 08:00	12/01/2026
8	Fouilles	3 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026
9	Nivellement + compactage	2 jours	16/01/2026 08:00	19/01/2026
11	Fondation	13 jours	20/01/2026 08:00	05/02/2026
12	Coffrage fondations	2 jours	20/01/2026 08:00	21/01/2026
13	Ferraillage fondations	2 jours	20/01/2026 08:00	21/01/2026
14	Bétonnage fondations	1 jour	22/01/2026 08:00	22/01/2026
15	Cure béton	10 jours	23/01/2026 08:00	05/02/2026
17	Soubassement	18 jours	06/02/2026 08:00	03/03/2026
18	Élévation murs de soubassement	2 jours	06/02/2026 08:00	09/02/2026
19	Remblaiement périphérique	2 jours	10/02/2026 08:00	11/02/2026
20	Dallage RDC	4 jours	12/02/2026 08:00	17/02/2026
21	Cure	10 jours	18/02/2026 08:00	03/03/2026
23	Structure du RDC	41 jours	04/03/2026 08:00	29/04/2026
24	Poteaux	14 jours	04/03/2026 08:00	23/03/2026
25	Coffrage	3 jours	04/03/2026 08:00	06/03/2026
26	Ferraillage	2 jours	04/03/2026 08:00	05/03/2026
27	Bétonnage	1 jour	09/03/2026 08:00	09/03/2026
28	Décoffrage+cure	10 jours	10/03/2026 08:00	23/03/2026
30	Poutres+Dalle	27 jours	24/03/2026 08:00	29/04/2026
31	Coffrage	5 jours	24/03/2026 08:00	30/03/2026
32	Ferraillage	3 jours	24/03/2026 08:00	26/03/2026
33	Bétonnage	2 jours	31/03/2026 08:00	01/04/2026
34	Décoffrage+cure	10 jours	02/04/2026 08:00	15/04/2026
35	Escalier	10 jours	16/04/2026 08:00	29/04/2026

ID	Nom	Durée	Début	
37	Structure du 1ere etage	41 jours	30/04/2026 08:00	25/06/2026
38	Poteaux	14 jours	30/04/2026 08:00	19/05/2026
39	Coffrage	3 jours	30/04/2026 08:00	04/05/2026
40	Ferraillage	2 jours	30/04/2026 08:00	01/05/2026
41	Bétonnage	1 jour	05/05/2026 08:00	05/05/2026
42	Décoffrage+cure	10 jours	06/05/2026 08:00	19/05/2026
44	Poutres+Dalle	27 jours	20/05/2026 08:00	25/06/2026
45	Coffrage	5 jours	20/05/2026 08:00	26/05/2026
46	Ferraillage	3 jours	20/05/2026 08:00	22/05/2026
47	Bétonnage	2 jours	27/05/2026 08:00	28/05/2026
48	Décoffrage+cure	10 jours	29/05/2026 08:00	11/06/2026
49	Escalier	10 jours	12/06/2026 08:00	25/06/2026
52	Structure du 2eme etage	41 jours	26/06/2026 08:00	21/08/2026
53	Poteaux	14 jours	26/06/2026 08:00	15/07/2026
54	Coffrage	3 jours	26/06/2026 08:00	30/06/2026
55	Ferraillage	2 jours	26/06/2026 08:00	29/06/2026
56	Bétonnage	1 jour	01/07/2026 08:00	01/07/2026
57	Décoffrage+cure	10 jours	02/07/2026 08:00	15/07/2026
59	Poutres+Dalle	27 jours	16/07/2026 08:00	21/08/2026
60	Coffrage	5 jours	16/07/2026 08:00	22/07/2026
61	Ferraillage	3 jours	16/07/2026 08:00	20/07/2026
62	Bétonnage	2 jours	23/07/2026 08:00	24/07/2026
63	Décoffrage+cure	10 jours	27/07/2026 08:00	07/08/2026
64	Escalier	10 jours	10/08/2026 08:00	21/08/2026
67	Murs	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026
68	Murs RDC	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026
69	Murs étage 1	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026
70	Murs étage 2	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026
73	Fin de chantier	3 jours	31/08/2026 08:00	02/09/2026
74	Nettoyage chantier	2 jours	31/08/2026 08:00	01/09/2026
75	Retrait installations	1 jour	02/09/2026 08:00	02/09/2026
